



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

DOCUMENTO DEL PROYECTO

País:

PERÚ

Título del proyecto:

Apoyo a la reconstitución de los medios de vida en las provincias altas de Yauyos y Pisco, afectados por el terremoto en Perú.

Número del proyecto:

OSRO/PER/704/EC

Fecha de comienzo:

Octubre 2007

Fecha de terminación

Marzo 2008

Contrapartes gubernamentales a cargo de la ejecución del proyecto:

**Ministerio de Agricultura (MINAG),
Provincia de Pisco y Yauyos,
Municipalidades, ONGs**

Contribución del donante:

€275 000 (aproximadamente \$EE.UU. 390 071)

Firmado: 

En representación del Gobierno

José Antonio García Belaunde
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

19 DIC. 2008

Fecha de la firma:


Firmado: 

Jacques Diouf
Director General

(En representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO)

Jean-François Ghyoot
Representante de la FAO a.i.

Fecha de la firma: 20-11-2007



COMISIÓN EUROPEA
DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDA HUMANITARIA (ECHO)

**Convenio de contribución – Organizaciones Internacionales
ANEXO I**

FORMULARIO ÚNICO PARA LAS ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Nombre de la Organización internacional

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO

1.2 Numero del CMA (si aplicable)

1.3 Objeto de la sumisión

1.3.1 Propuesta

Nueva propuesta



fecha: 15.09.07

Propuesta revisada



fecha: 28.09.07

Referencia ECHO 07.12258

fecha: 12-09-07

1.4 Numero del Convenio de contribución ECHO/PER/BUD/2007/02014

1.5 Reglas de puesta en ejecución aplicables a este convenio

Subvención, financiamiento al 100%



Subvención, cofinanciamiento



Acción multi donante



1.6 Marco de esta sumisión

Decisión de primera urgencia



Decisión de emergencia



Decisión ad hoc



Plan global



DIPECHO



Otro, favor de especificar



1.7 Resumen general de la Acción

La necesidad de intervenir en apoyo a la rehabilitación de la capacidad productiva y medios de vida de las familias damnificadas por el terremoto del 15 de Agosto de 2007 en el departamento de Ica (Pisco) y Lima (Yauyos) en Perú, ha sido el punto de partida para la preparación de la presente propuesta.

Luego de una evaluación de daños realizada por el personal de FAO, reuniendo información acerca del desastre proveniente de las entidades del Gobierno y de otras Agencias de las NNUU, la FAO ha estimado un número de familias afectadas de 674, en la provincia de Yauyos, departamento de Lima, y distrito de Huancano, provincia de Pisco, departamento de Ica. Ambas zonas son de sierra media a alta (más de 2 000 msnm).

A fin de reiniciar sus actividades productivas en la perspectiva de mejorar su situación de seguridad alimentaria, la propuesta busca atender a las personas de estas familias con:

- distribución de módulos de semillas para la instalación de cultivos para una extensión de 0.5 ha por familia (cereales, menestras, hortalizas y pastos);
- distribución de herramientas para recuperar la situación en que han quedado los campos de cultivo y sistemas de riego en parcelas; y
- distribución de módulos de cuyes (un macho y cuatro hembras).

También se ha integrado en la propuesta la distribución de cocinas mejoradas para el procesamiento de sus alimentos así como silos metálicos para la conservación de sus granos y semillas.

El período de ejecución de este Proyecto, será de seis meses, y ha integrado también acciones de capacitación que tendrán como eje temático fundamental, a parte del adecuado empleo de los insumos y ayuda por entregar, la organización y creación de una cultura de prevención. Para la ejecución global del proyecto se ha considerado la participación de las instituciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), productores organizados, y entidades presentes en la zona.

(4.1) Título de la Acción

**Apoyo a la reconstitución de los medios de vida en las partes altas de Yauyos y
Pisco, afectadas por el terremoto en Perú.**

(4.2) Lugar de implementación de la Acción

Seis distritos de la Provincia de Yauyos, Departamento de Lima; y uno de la provincia de Pisco, Departamento de Ica.

Ver el anexo para un mapa de la ubicación.

(4.3) Fecha de comienzo de las actividades en el terreno (Fecha de comienzo de la Acción)

Primero de octubre. La FAO puede empezar el proyecto inmediatamente tras haber recibido el acuerdo de ECHO. Sin embargo, una carta de ECHO Bruselas a la FAO es necesaria.

(4.4) Duración en meses

Seis Meses (termina a fines de Marzo 2008)

(4.5.1) Número total de beneficiarios directos

2 500 personas (500 familias), en seis distritos de la provincia de Yauyos en el Departamento de Lima, y en el distrito de Huancano en la provincia de Pisco del Departamento de Ica. Estas zonas corresponden a zonas de sierra media alta.

Los daños principales han sido la destrucción de viviendas, corrales, huertas familiares, almacenes, cobertizos, ambientes donde conservaban sus semillas, granos y otros alimentos tanto humano como animal e infraestructura de irrigación.

(4.5.2) Identificar el estatus y proporcionar informaciones sobre los beneficiarios

Familias de campesinos vulnerables – pobres o extremadamente pobres – de los distritos de Laraos, Tupe, Viñac, Madean, Choco y Huangascar en Yauyos, Lima; y de Huancano en Pisco, Ica.

(4.7.1) Objetivo específico de la Acción

Rehabilitación de los medios de vida de la población campesina afectada por el terremoto a través de la reposición de insumos (semillas, silos, animales pequeños y herramientas) y servicios familiares (cocinas mejoradas).

(4.7.2) Indicadores y fuentes de verificación

Indicadores

Del objetivo general:

Dos mil quinientas personas recuperaron sus medios de subsistencia

De los objetivos específicos:

- 250 hectáreas instaladas con la semilla distribuida para la rehabilitación de su producción agrícola.
- 500 módulos de cuyes entregados a las familias afectadas y reporte de resultados reproductivos.
- 500 silos para almacenamiento de granos y semillas entregados y siendo utilizados por las personas de las familias receptoras.
- 500 módulos de herramientas entregados, y reporte de avance de recuperación de canales de tierra para riego de parcelas.

Medios de verificación

- Reportes de entrega de insumos agrícolas, registro de beneficiarios y acuses de recibo.
- Visitas de terreno, informe de seguimiento
- Entrevistas a beneficiarios.
- Informes de siembra de cultivos y de incremento reproductivo de cuyes en familias beneficiarias y de avance de rehabilitación de canales de tierra.

(4.8.1) Resultado esperado 1a

2 500 personas campesinas atendidas por el proyecto con módulos de semillas de 0.5 hectáreas por familia.

(4.8.2) Resultado esperado 1b

500 módulos de cuyes entregados e instalados por las familias beneficiarias

(4.8.3) Resultado esperado 2a

500 módulos de herramientas han sido recibidos por las familias damnificadas para la rehabilitación de sus canales de tierra de sus pequeños sistemas de riego, y para la reanudación de sus actividades agrícolas

(4.8.4) Resultado esperado 2b

500 cocinas mejoradas y 500 silos metálicos han sido recibidos por las familias beneficiarias.

(11.1) Presupuesto total de la Acción:	EUR 275 000
(11.2) Contribución pedida a la Comunidad europea:	EUR 275 000
(11.5) Elegibilidad de los gastos, fecha:	26 de septiembre 2007

2 EVALUACIÓN DE NECESIDADES

2.1 Fecha(s) de la evaluación

- Instituto Nacional de Defensa Civil, ha evaluado del 17 al 22 de Agosto del 2007.
- La FAO ha realizado dos misiones de evaluación entre el 21 y 23, y entre el 25 y 26 de Agosto del 2007.
- OCHA, a través de las Agencias de las NNUU ha realizado evaluaciones entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, luego de lo cual se ha liberado el Flash Appeal.
- Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de Yauyos, que ha liberado un reporte de daños hasta el 27 de Agosto del 2007.

2.2 Metodología y fuente de información utilizadas

Para la formulación del Proyecto, se ha contado con información generada por el sistema de Naciones Unidas en el Perú, cuyas Agencias especializadas han realizado misiones de evaluación in situ y han concatenado una serie de esfuerzos para reunir información actualizada diariamente. La FAO contrató los servicios de un consultor nacional

Asimismo, el Sistema Nacional de Defensa Civil, ha estado liberando, desde la ocurrencia del sismo, reportes de daños, evaluaciones, actualizaciones, que han servido de base para conocer los lugares afectados, los daños a la propiedad, inversiones y vidas humanas, así como las necesidades para el apoyo en rehabilitación.

El Sistema de las Naciones Unidas, a través del Llamamiento de financiamiento Perú Terremoto (Flash Appeal Peru Earthquake 2007), ha realizado un detallado listado de las necesidades para apoyar la rehabilitación abarcando todos los enfoques que requieren atención: refugios, sanidad, salud humana, educación, agricultura, transportes, infraestructura productiva.

El 28 de Agosto 2007, las NU han hecho este llamamiento de 37 millones de dólares EU, de los cuales 13,85 millones han sido pedidos para las necesidades alimentarias y la recuperación de los medios de subsistencia de las poblaciones damnificadas que vivían principalmente de sus actividades agrícolas y de pesca artesanal. Esta propuesta de proyecto forma parte de la componente FAO del Llamamiento PER-07-A03 para la recuperación de los medios de vida de la población rural afectada por el terremoto.

Asimismo, instituciones estatales como el INDECI e INRENA, han establecido sitios Web en Internet para brindar toda la información sobre la situación y daños en las zonas afectadas.

Finalmente, los municipios distritales han realizado sus evaluaciones, las cuales han sido consolidadas y transmitidas a posibles donantes de ayuda para rehabilitación; la FAO en Perú, ha recibido también esta información, la cual ha estado integrando a la programación de ayuda correspondiente.

Como corresponde, la información recibida de diversas Fuentes ha sido cruzada para la correspondiente consistencia y consolidación, y para la elaboración de la presente propuesta.

2.3 Personas de la Organización/responsables de la evaluación

La Representación de FAO en Perú, a través de un equipo de cuatro consultores y el Coordinador Regional de Emergencias para América Latina y El Caribe ha realizado visitas a campo, reuniones con Agencias especializadas e instituciones públicas para recopilar información y realizar la evaluación de la situación y formulación de la propuesta de rehabilitación.

Asimismo, en Yauyos se ha instalado el Centro de Operaciones conformado por las diferentes instituciones que tienen acciones en la zona, quienes han liberado su último reporte el 27 de Agosto, con un resumen de los daños en todos los sectores de la vida de la provincia.

2.4 Detalles del problema y análisis de afectados

Detalles del problema

El 15 de Agosto del 2007, a las 6:34 pm, hora local, la zona sur de la región central del Perú, fue sacudida por un terremoto que alcanzó 7.2 grados en la escala de Richter y 7.9 en la escala de Magnitud de Momento; el epicentro se localizó a 60 Km al oeste de la ciudad de Pisco, departamento de Ica, mar adentro; particularmente agravante fue la larga duración de dicho evento, que se registró en 4 minutos aproximadamente, según el Instituto Geofísico del Perú. Durante los ocho días siguientes, han continuado las réplicas del sismo, teniendo algunas de ellas hasta grado 5 en escala de Richter, con lo cual algunas viviendas y construcciones han continuado colapsando en la zona del desastre. El reporte indica que la máxima magnitud, de hasta 7 fue sentida en un radio de aproximadamente 250 Km del epicentro, con lo cual las localidades cercanas, como las ciudades de Ica, Chíncha, Cañete, en la costa y las provincias de Yauyos, Castrovirreyna y Huaytará, y la sierra de Chíncha, en la transición costa-sierra hacia el Este fueron de las más afectadas. En él área circundante a la ciudad de Ica, el terremoto ha afectado las explotaciones agropecuarias de todo tipo, desde las pequeñas hasta las grandes orientadas a la agro exportación. Las poblaciones más afectadas han sido las rurales pobres, en particular aquellas más vulnerables, con problemas de seguridad alimentaria y muy limitados recursos.

La imposibilidad de contar con medios inmediatos de alimentación, y de generación de ingresos va a condicionar una rápida migración a las ciudades cercanas, acentuando el problema social ya generado en las mismas que también han sido devastadas por el sismo.

El Gobierno de Perú, ha iniciado una serie de esfuerzos a atender la emergencia primaria, consistente en alimentos, medicinas y medios de abrigo y protección para las familias damnificadas, pero las necesidades son mucho mayores y ahora se centran en el preparar acciones de rehabilitación para que las capacidades productivas de estas familias sean reactivadas y se reincorporen a la actividad normal lo antes posible. Así se logrará reactivar la economía local.

- Inclusive la demanda local por mano de obra, se ha visto disminuida por que la mayoría de pobladores lo ha perdido todo y también ha perdido la capacidad de sembrar mayores áreas de terreno, por lo que no están en capacidad de tomar personal para labores de preparación de terreno como era típico de esta época de inter-estación.
- Se cierne otro problema para los agricultores puesto que si no se siembran terrenos agrícolas, serán abandonados durante la campaña, con lo que el avance de las malezas será mayor y par alas subsiguientes campañas van a significar problemas serios al momento de la limpieza de campos.

En este contexto, donde queda apenas dos meses para el inicio de la siguiente estación lluviosa, se hace necesario actuar con urgencia para rehabilitar las infraestructuras de riego.

Aún más, dada la pérdida de cultivos y alimentos almacenados, se ha reducido las reservas de alimentos, y la gente pobre requiere de una rápida acción de reactivación.

Análisis de involucrados

Gobierno

El Gobierno del Perú ha dictado normas de nivel nacional declarando en Emergencia a estas provincias a través de los DS 068, 071 y 075-2007-PCM. El Sistema Nacional de Defensa Civil también ha organizado la recepción de ayuda humanitaria del país y del extranjero, lo cual incluye un sistema logístico para la distribución de las donaciones a las poblaciones afectadas. Por otro lado, los diferentes Ministerios han implementado acciones para atender la emergencia como la remoción de deslizamientos en las carreteras de acceso a la zona del desastre, instalación de grupos electrógenos de emergencia para restablecer servicios de luz y agua priorizando las zonas de mayor atención médica a los afectados, entre otros. Los mecanismos de ayuda social del Gobierno han distribuido alimentos y agua a las poblaciones afectadas, y la ayuda de diversos países y organizaciones internacionales ha comenzado a llegar para ser distribuida por los canales establecidos por el Gobierno.

La atención de asuntos de agricultura y ganadería por parte del Estado está a cargo de la Agencia Agraria Cañete para la provincia de Yauyos y de la Agencia Agraria Pisco para el distrito de Huancano.

Gobiernos locales

En el ámbito se encuentran el municipio provincial de Yauyos, que incluye 33 distritos, de los cuales son Tupe, Huañec y Laraos los más afectados; el INDECI reporta que hay 8 100 personas damnificadas y 2 470 afectadas; y el municipio distrital de Huancano en la provincial de Pisco en Ica. Ambas autoridades son por norma los responsables de Defensa Civil, y han reportado los daños que permiten indicar. En Huancano, se ha reportado que hay 2 900 personas familias damnificadas (reporte del alcalde, el 27/08/2007).

ONGs

Algunas ONGs que tienen presencia cerca a las zonas afectadas están apoyando los esfuerzos de rehabilitación, tal es el caso del Instituto Valle Grande a cargo de la Promotora de Obras Sociales y de Instrucción Popular, con sede en Cañete. En Pisco se encuentra también Agro Acción Alemana, Médicos sin fronteras y Oxfam Internacional.

Donantes

Los esfuerzos de la FAO por conseguir financiamiento, han tenido eco en la Unión Europea, que a través de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). Esta organización ha estado ya enviando ayuda consistente en alimentos, albergues temporales,

asistencia médica, artículos de higiene, agua y saneamiento, así como el establecimiento de instalaciones de telecomunicaciones de emergencia y apoyo psicosocial.

2.5 Resultados de la evaluación

Los principales hallazgos de las evaluaciones realizadas son:

- a) Se reportan 3 370 personas, de las cuales, 2 500 se van a apoyar con el presente proyecto de rehabilitación..
- b) En Huancano, se han afectado 3175 m de acequias de riego que irrigan 147 predios rurales que abarcan 488 ha. Los principales cultivos son frijol, tomate y maíz Amarillo, además de hortalizas y otros productos de pan llevar.
- c) En los distritos de Yauyos, los principales cultivos son cebada, haba, maíz amiláceo y arveja.
- d) Más de 600 viviendas totalmente colapsadas en Yauyos, con lo cual se han perdido también los corrales y ambientes para almacenamiento de semillas y alimentos en estas viviendas. Las coordinaciones para canalizar la ayuda para rehabilitación no consideraron inicialmente la atención a la zona por que no se ha tenido acceso por la interrupción de carreteras hacia las zonas afectadas.
- e) Los municipios no han tenido capacidad de canalizar la ayuda puesto que tampoco han tenido funcionando ningún sistema de prevención de desastres ni evaluación de daños ni cuantificación de daños.
- f) Las organizaciones locales como las comunidades también han demostrado no estar preparadas para estas situaciones y su desorganización ha sido total, haciendo que la emergencia comience a ser atendida con alguna incidencia a partir de los dos días de ocurridos los problemas.
- g) Por la época del año en que ha ocurrido el sismo, las áreas de cultivos y pastos que han estado instaladas en zonas abrigadas de sierra han tenido como única provisión de agua la que traían los pequeños sistemas de riego locales, la mayoría de los cuales ha sido afectada con interrupción, colmatación o fractura de canales. Es urgente que ahora la atención para estos cultivos y pastos sea prioritaria para no perder la inversión que los pequeños agricultores han realizado en ellas.

3 ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

3.1 Estrategia de la Organización en el país y/o la región de implementación.

En respuesta a anteriores situaciones de desastre, que han ocurrido en el Perú desde 1997, la FAO ha estado contribuyendo en la "rehabilitación" de la capacidad productiva agropecuaria de las poblaciones rurales damnificadas, habiendo ejecutado varios proyectos orientados no sólo al suministro de insumos básicos, herramientas y equipo menor; sino también en acciones propias de ejecución y seguimiento en forma conjunta con las instituciones que participan como contraparte nacional. Estos proyectos han proporcionado asistencia técnica y capacitación, que permitieron obtener cosechas adecuadas para mejorar su seguridad alimentaria y provisión de semillas, de la misma forma ha promovido un cambio de actitud para enfrentar en lo sucesivo eventos adversos.

La experiencia acumulada por la FAO en regiones similares, la hace particularmente elegible para atender en esta oportunidad las tareas de rehabilitación de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en la costa del Perú; el conocimiento de metodologías, agilidad logística y administrativa, excelente nivel técnico y presencia institucional de prestigio, son ventajas importantes en esta oportunidad.

La FAO, a través de la recientemente establecida Unidad de Coordinación de Emergencias (UCE), está apoyando al Ministerio de Agricultura en la coordinación con todos los actores activos en la rehabilitación de las áreas rurales y el sector agrícola/pesquero afectados

La FAO, como agencia técnica especializada de Naciones Unidas y en el marco de su mandato, apoya el Gobierno, las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias en coordinar la asistencia a los campesinos y pequeños pescadores en las zonas afectadas por desastres naturales. Ya se han organizado reuniones de coordinación con las organizaciones gubernamentales, las ONG y las agencias de Naciones Unidas para coordinar las intervenciones en las zonas rurales y las costas afectadas. Estas reuniones se harán regularmente en vista de evitar duplicaciones y maximizar el impacto de la ayuda. La FAO brindará apoyo a todos los demás actores humanitarios con asistencia técnica para promover buenas prácticas agrícolas. La FAO ha creado en Perú una Unidad de Coordinación de Emergencias para desarrollar este papel.

Las estrategias de la FAO se basan en:

- a) La comunidad como punto de partida; por medio de procesos participativos, se identifican las prioridades y el interés de las familias y responden a un proceso negociado entre la demanda local y la oferta del Proyecto.
- b) Organización de los grupos de interés al nivel comunal. Los miembros de la comunidad definen estos grupos a través de su propia identificación de intereses y prioridades.
- c) Definición de las intervenciones prioritarias en base a las demandas de las familias, grupos de interés y de la comunidad.
- d) Respuestas rápidas y de bajo costo a los problemas prioritarios.
- e) Priorización de insumos, materiales y mano de obra, locales.
- f) Ejecución a través de organizaciones, pequeños negocios y productores individuales locales.
- g) Incentivos enfocados al estímulo de creación de capacidades locales, en lugar de donaciones, orientadas a la capitalización local.
- h) Actividades en campo realizadas por las poblaciones locales.
- i) Coordinación y compromiso con familias organizadas, comunidades, municipalidades y otras asociaciones en el planeamiento, monitoreo y evaluación de las inversiones y la asistencia técnica brindada.
- j) Generación y transferencia de capacidades a las familias, comunidades, organizaciones, municipalidades y asociaciones locales.

Disposiciones operacionales para la ejecución del Proyecto

Para la ejecución del Proyecto, la FAO tomará en cuenta que los Gobiernos Regionales asegurarán el tejido de relaciones interinstitucionales que incluya a entidades técnicas y organizaciones de productores. Las Agencias Agrarias igualmente deberán establecer relaciones permanentes con los productores damnificados y sus organizaciones, integrando a los Municipios Distritales cuya intervención en la reacción a la ocurrencia de desastres es muy importante y está reconocida por el marco legal vigente. El proyecto dispondrá de dos centros de operaciones ubicados en Yauyos y en Huancano que estarán en contacto permanente con la Representación de la FAO en Lima, donde se ubica la Unidad de Coordinación de Emergencias (UCE).

El proyecto será responsabilidad de la Representación de la FAO en Perú; ésta se encargará de la supervisión, y tendrá a la UCE como su principal ente técnico. Para asegurar una ejecución satisfactoria del Proyecto, la UCE tiene un Coordinador y a un equipo de técnicos especializados, los que presentarán reportes bimensuales de avance del Proyecto.

La UCE de la FAO en Perú realizará las siguientes funciones durante la ejecución del Proyecto:

- Coordinar con las entidades públicas responsables de la atención de emergencias (INDECI, gobiernos locales y gobiernos regionales).
- Mantener vínculos activos con los mecanismos nacionales e internacionales especializados en la atención de las emergencias (donantes).

- Impulsar mecanismos y metodologías de evaluación rápida sobre impactos provocados por el terremoto.
- Asegurar la disponibilidad de capacidad técnica para la priorización y puesta en marcha de las primeras y sucesivas acciones en la atención de las emergencias.
- Analizar los canales logísticos, capacidad e infraestructura local existentes para asegurar una apropiada y eficiente respuesta de ayuda.
- Establecer vínculos de co-responsabilidad operativa en la distribución de los insumos y equipos orientados a la atención de la emergencia.
- Establecer sistemas de reportes activos, monitoreo y evaluación de las actividades de respuesta a la emergencia realizadas de la FAO.
- Mantener coordinación con el Donante respecto a los avances de ejecución del Proyecto.
- Realizar la evaluación ex post, sistematizar las experiencias de la intervención, documentarlas y difundirlas.

3.2 Vínculo entre la Acción, los resultados de la evaluación, y el análisis del problema.

El Proyecto propone las siguientes acciones para apoyar la rehabilitación de los medios de vida de las familias en las comunidades afectadas:

- a) Rehabilitación de los elementos de subsistencia (medios para provisión de alimentos vegetales y animales) para los medios de vida locales.
- b) Recuperar la infraestructura de irrigación y los medios familiares de alimentos (cocinas y silos).

3.3 ¿Existe (n) Acción (es) similares en el país/región?

Debido a la magnitud de los daños, instituciones del Gobierno Nacional y Regional, así como ONGs y organismos internacionales están apoyando los esfuerzos de rehabilitación en diferentes localidades de todo el ámbito afectado, y orientando sus actividades hacia diferentes sectores como la educación, salud pública, vivienda, comunicaciones, etc.

A nivel nacional

La FAO está iniciando la ejecución de dos proyectos de apoyo a la rehabilitación, uno de ellos financiado por el CERF de las NNUU, y el otro con financiamiento del Gobierno de Bélgica. A parte, el Sistema Nacional de Defensa Civil ha conseguido financiamiento de diversas fuentes para apoyar esfuerzos en las diferentes provincias de los departamentos de Ica, Huancavelica y Lima.

3.4 Acciones humanitarias precedentes financiadas con fondos de la CE en el país/región

Para la FAO Perú, esta es la primera oportunidad en que va a trabajar en colaboración con ECHO. Pero se ha ejecutado anteriormente un Proyecto para apoyo a rehabilitación luego del paso del Huracán STAN en Haití, y en Honduras luego de la ocurrencia del Huracán MITCH.

3.5 ¿Ha usted discutido la propuesta con la oficina de asistencia técnica de ECHO en el país/región?

Si ☒ No ☐

Se han tenido reuniones entre el Coordinador Regional de Emergencias de la FAO para América Latina y el Caribe, el Representante de la FAO en el Perú, y el representante local de ECHO y el representante de ECHO en Quito. De estas reuniones ha resultado la aprobación de financiamiento para la presente propuesta.

4. MARCO OPERATIONAL

4.1 Título de la Acción

Apoyo a la reconstitución de los medios de vida en las partes altas de Yauyos y Pisco, afectadas por el terremoto en Perú.

4.2 Lugar de implementación de la Acción

Provincia de Yauyos en el departamento de Lima, y distrito de Huancano en la provincial de Pisco del departamento de Ica.

4.3 Fecha de comienzo de las actividades en el terreno (Fecha de comienzo de la Acción)

Primero de octubre. La FAO puede empezar el proyecto inmediatamente tras haber recibido el acuerdo de ECHO. Sin embargo, una carta de ECHO Bruselas a la FAO es necesaria.

4.4 Duración en meses

06 meses (termina a fines de Marzo 2008)

4.5 Beneficiarios

4.5.1 Número total de beneficiarios directos

2500 personas afectadas entre los distritos de la provincia de Yauyos en el departamento de Lima y del distrito de Huancano en la provincial de Pisco del departamento de Ica.

Cuadro 1 Distribución prevista para las familias damnificadas

Se= semillas ;He= herramientas y regaderas Cu:cuyes, S=Silos Co=cocinas

Provincia	Distritos	N° familias beneficiarias	Componentes				
			Se	He	Cu	S	Co
Yauyos	Laraos	60	X	X	X	X	X
	Tupe	160	X	X	X	X	X
	Viñac, Madean, Choco y Huangascar	130	X	X	X	X	X
Pisco	Huancano	150	X	X	X	X	X

4.5.2 Identificar el estatus y proporcionar informaciones sobre los beneficiarios

Los beneficiarios directos son las 2 500 personas entre las 3 375 damnificadas que han sido censadas. Están incluidas las que han perdido sus viviendas y por tanto sus posibilidades de provisión de alimentos, así como las que por situación de extrema pobreza no tiene otra alternativa para recuperar su posibilidad de reactivar su capacidad productiva afectada. Su actividad principal es la agricultura de subsistencia.

Cuadro 2 Mapa de pobreza, Foncodes, 2006

Departamento	Provincia	Distrito	Población 2005	Índice de carencias 1/	Quintil del índice de carencias 2/	% de la población sin:			Tasa analfab. Mujeres	% niños de 0-12 años	Tasa de desnutric. 1999
						agua	Desag./letrín.	electric.			
ICA	Pisco	Huancano	1 528	0.2641	2	62%	32%	23%	10%	27%	31%
LIMA	Yauyos	Chocos	1 149	0.5422	2	49%	50%	39%	19%	33%	40%
	Yauyos	Huangascar	724	0.3534	2	33%	27%	49%	13%	30%	34%
	Yauyos	Madean	846	0.7267	1	38%	86%	41%	21%	36%	48%
	Yauyos	Tupe	723	0.4164	2	52%	100%	34%	24%	24%	18%
	Yauyos	Viñac	1 914	0.7052	1	44%	62%	46%	29%	34%	46%

Fuente. Foncodes, elaboración: FAO.

4.5.3 Población potencialmente cubierta ("Catchment population")

Con base en un estimado de cinco personas por familia, se estima que la población captada como beneficiaria estará alrededor de 2500 personas.

4.5.4 ¿Cuales son los criterios y mecanismos de identificación?

Enfoque general

La estrategia de identificación tomará en cuenta el establecimiento de alianzas con las autoridades locales, los mismos pobladores organizados y otras instituciones con base en la zona de intervención, de modo que la priorización sea fruto de un proceso de evaluación local de beneficiarios, entre los más afectados y los más necesitados.

Criterios

Los criterios de selección de beneficiarios serán los siguientes:

- Ser agricultor o mujer rural involucrados en actividades agropecuarias y/o de crianza..
- Haber sido damnificado por el terremoto del 15 de Agosto 2007.
- No tener recursos para comprar insumos y herramientas agrícolas.
- Ser vulnerable a los desastres.

4.5.5 ¿En que medida y en que modo los beneficiarios han sido involucrados en la concepción de la Acción?

Las misiones técnicas de la FAO, que han visitado las zonas y han tomado contacto con autoridades u otras misiones de agencias que han estado presentes en el lugar, han recogido directa e indirectamente la expresión de las necesidades más urgentes por parte de los mismos

damnificados; en esta medida, la integración de los componentes de esta propuesta guardan relación estrecha con las necesidades.

Cabe indicar que en el proceso se ha seguido los siguientes criterios:

- Las necesidades identificadas y priorizadas las han hecho los damnificados mismos.,
- El re-establecimiento de los medios de vida, es necesario pero no es suficiente puesto que la gran mayoría de las poblaciones de estas zonas ya tenían una situación precaria antes del terremoto.
- La urgencia de desarrollar maneras más sostenibles de manejar los recursos naturales y de incorporar la cultura de prevención de desastres.

4.5.6 Sectores de actividades

Sector de intervención: Agricultura y seguridad alimentaria

Actividad 1: Alimentación y Seguridad alimentaria, a través de la distribución de semillas, cocinas mejoradas y módulos de cuyes que permitirán reactivar sus medios de vida.

4.5.7 Proporcionar información sobre cada sector

La población objetivo es de agricultura de subsistencia. Sus principales cultivos son los cereales, la papa, menestras y en menor grado hortalizas. Su principal crianza familiar es el cuy, pero un gran número de familias tiene pequeños hatos de ganado mayor como vacas, ovinos, camélidos, cerdos, entre otras especies.

En la zona prácticamente no existe otra actividad generadora de ingresos para la familia, salvo algunas especialidades locales como los artesanos, zapateros, y pequeños comerciantes.

La tecnología empleada tanto para los cultivos como para las cranzas es tradicional y por tanto sus niveles de rendimiento son bajos. Existen pequeños canales de tierra que se utilizan para conducir el agua de riego en las zonas que cuentan con disponibilidad de agua, pero en las amplias extensiones donde se cultiva en seco, en esta época las familias se dedican a la preparación y limpieza de los campos antes del inicio de la época de lluvias que dura desde octubre hasta abril.

La situación de la crianza de cuyes ha sido afectada por que al dañarse las viviendas, los animales han escapado, han muerto o han quedado a merced de predadores.

4.6. Objetivo general

Rehabilitación de los medios de vida de las familias afectadas por el terremoto y su reincorporación a la actividad productiva.

4.7. Objetivos específicos de la Acción

4.7.1 Objetivos específicos

Rehabilitación de los medios de vida de la población campesina afectada por el terremoto a través de la reposición de insumos (semillas, silos, animales pequeños y herramientas) y servicios familiares (cocinas mejoradas).

4.7.2 Indicadores y medios de verificación

Indicadores

Del objetivo general:

2 500 personas recuperaron sus medios de subsistencia

De los objetivos específicos:

- 250 hectáreas instaladas con la semilla distribuida para la rehabilitación de su producción agrícola.
- 500 módulos de cuyes entregados a las familias afectadas y reporte de resultados reproductivos.
- 500 silos para almacenamiento de granos y semillas entregados y siendo utilizados por las familias receptoras.
- 500 módulos de herramientas entregados, y reporte de avance de recuperación de canales de tierra para riego de parcelas.

Medios de verificación

- Reportes de entrega de insumos agrícolas y cuyes registro de beneficiarios y confirmación de recepción.
- Visitas de terreno, informe de seguimiento
- Entrevistas a beneficiarios.
- Informes de siembra de cultivos y de incremento reproductivo de cuyes en familias beneficiarias y de avance de rehabilitación de canales de tierra.

4.8 Resultados e indicadores

4.8.1 Resultado 1, indicador(es) apropiado(s) y medio (s) de verificación

31 500 kg de semillas (cereales/leguminosas/hortalizas) distribuidas a 2500 personas

Indicadores determinantes

- Registros de los 500 beneficiarios jefes de familia

Medios de verificación:

- Reporte de entrega y recepción.
- Reportes de siembra
- Fotografías, videos, entrevistas.

4.8.2 Resultado 2, indicador(es) apropiado(s) y medio (s) de verificación

500 módulos de cuyes entregados e instalados por las familias beneficiarias.

Indicadores determinantes:

- Registros de los 500 beneficiarios jefes de familia

Medios de verificación:

- Reportes de instalación de módulos de cuyes.
- Medios fotográficos, entrevistas.

4.8.3 Resultado 3, indicador(es) apropiado(s) y medio (s) de verificación

500 módulos de herramientas han sido recibidos por las familias damnificadas para la rehabilitación de sus canales de tierra de sus pequeños sistemas de riego.

Indicadores determinantes:

- Registros de los 500 beneficiarios jefes de familia

Medios de verificación

- Reporte de entrega y recepción
- Reportes técnicos de canales de tierra rehabilitados y listos para operar.
- Fotografías
- Reportes técnicos.

4.8.4 Resultado 4, indicador(es) apropiado(s) y medio (s) de verificación

500 cocinas mejoradas y 500 silos metálicos han sido recibidos por las familias beneficiarias.

Indicadores determinantes:

- Registros de los 500 beneficiarios jefes de familia

Medios de verificación

- Fotografías
- Reportes técnicos sobre el uso de las cocinas y los silos.

4.9. Actividades

Este proyecto tendrá las siguientes actividades:

Actividades para el resultado 1

- Identificación de las familias beneficiarias, precisando su ubicación por centro poblado, y distrito, con intervención de autoridades locales.
- Programación de atenciones y visitas para hacer el plan de distribución.
- Elaborar las especificaciones técnicas y el plan de adquisiciones y traslado.
- Entrega de insumos y seguimiento de las siembras en campo.

Actividades para el resultado 2

- Identificación de familias beneficiarias con tradición de crianza familiar.

- Identificación de proveedores y organización de adquisición, traslado y entrega de módulos de cuyes.

Actividades para el resultado 3

- Identificación de los beneficiarios, inventario de sus pequeños canales de riego que serán incluidos en la rehabilitación.
- Detalle de las especificaciones técnicas de las herramientas a entregar. Organización del procedimiento de cotizaciones, logística y entrega.
- Rehabilitación de canales.

Actividades para el resultado 4

- Identificación de familias beneficiarias, evaluación de necesidades estructurales en sus viviendas para la instalación de las cocinas mejoradas y los silos metálicos.
- Determinación de las especificaciones técnicas para la construcción de las cocinas mejoradas y de los silos.
- Cotizaciones, construcción, traslado, entrega y supervisión de la instalación en las viviendas.

4.10 Plan de trabajo

Tareas	Meses					
	1	2	3	4	5	6
Aprobación de financiamiento						
Suscripción de convenios						
Selección de personal						
Socialización del Proyecto						
Resultado 1						
Identificación de beneficiarios						
Elaboración de plan de distribución						
Elaborar especificaciones técnicas y adquisición						
Entrega de insumos						
Siembras en campo						
Resultado 2						
Identificación de beneficiarios						
Identificación de proveedores, adquisición y entrega						
Resultado 3						
Identificación de beneficiarios, inventario de canales						
Especificaciones técnicas, adquisiciones, entrega						
Rehabilitación de canales						
Resultado 4						
Identificación de beneficiarios, evaluaciones de necesidades						
Especificaciones técnicas, construcción, entrega						
Visibilidad y programa de comunicación						
Informe final						
Informe financiero						

4.11 Seguimiento y evaluación

4.11.1 Seguimiento

Las actividades de seguimiento serán efectuadas a través la Unidad de Coordinación de Emergencias de la FAO en Perú, de forma que se implementen coordinadamente las acciones de otros actores y de todo el Programa de Emergencia de la FAO en Perú.

Está prevista una evaluación intermedia, en la que participarán representantes del Donante.

4.11.2 Evaluación

- ¿Se ha previsto una evaluación durante la Acción?
Si ☒ No ☐
- ¿Se ha previsto una evaluación después de la Acción?
Si ☒ No ☐

5 RIESGOS E HIPÓTESIS

5.1 Condiciones previas

Condiciones previas para la implementación del Proyecto:

- Participación activa y solidaria de los beneficiarios en todo el proceso.
- Las condiciones de seguridad para el personal de la FAO o que actúe en su representación están aseguradas y siguen las normas de las NNUU.
- Las actividades y su implementación guardan correspondencia con los principios de ayuda humanitaria de ECHO.

5.2 Hipótesis y análisis de riesgos

En relación al contexto del Proyecto

La rehabilitación productiva de las áreas afectadas por el terremoto, es una prioridad del Gobierno Central y del Gobierno Regional correspondiente, en esa medida, no existe el riesgo de abandonar la colaboración ni el compromiso para la efectiva llegada de la ayuda a los beneficiarios identificados.

Al nivel de resultados

Existe una buena coordinación con los organismos locales públicos y privados para la ayuda coordinada y global dentro de un marco de estrecha colaboración de manera que las capacidades productivas sean efectivamente resarcidas.

Al nivel de actividades

- Las carreteras y vías de acceso han sido rehabilitadas y no constituyen impedimento para la oportuna llegada de la ayuda, de su distribución y empleo.
- Las etapas de identificación y determinación de requerimientos así como la adquisición se han realizado adecuadamente de modo que la cantidad y calidad de ayuda a entregar no encuentra ningún problema en efectivizarse.

5.3 Seguridad

5.3.1 Situación en el terreno

El personal de la FAO cumple con las normas y regulaciones de las NNUU en materia de seguridad.

5.3.2 ¿Ha usted establecido un protocolo de seguridad para esta Acción?

Si ☐ No ☐ Procedimiento estándar ☒

5.3.3 ¿Tiene usted un plan específico de evacuación por motivos de salud o de seguridad en el marco de esta?

Si ☐ No ☐ Procedimiento estándar ☒

5.3.4 ¿Su personal de terreno y expatriado esta informado y capacitado sobre estos procedimientos?

Si ☒ No ☐

6 RECURSOS NECESARIOS

6.1 Presupuesto total (punto 11.1.)

EURO 275 000

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Personal incluido bajo el título 1 "Bienes y servicios proporcionados a los beneficiarios".

Recursos humanos	Numero	Duración (personas-meses)
Personal nacional		
Consultores en rehabilitación	2	06

6.2.2 Personal incluido bajo el título 2 "Costos de apoyo"

Recursos humanos	Numero	Duración (personas-meses)
Personal de apoyo		
Administrativo	2	04
Guardián	6	04

6.3 Recursos en materiales

Los materiales e insumos están constituidos por semillas de cereales, menestras, hortalizas, pastos y papa; mangueras y aspersores para los sistemas de riego, herramientas para rehabilitación de canales de riego. Silos metálicos y cocinas mejoradas que serán construidas según especificaciones técnicas, de preferencia en zonas cercanas para colaborar en reactivar la economía del lugar.

6.3.1 Equipo

El siguiente equipo necesario será adquirido para la ejecución del proyecto.

- Camioneta pickup 4 x 4 (aprox. 17 000€)
- Motocicleta de 250 cc (aprox. 3 400€)
- Ordenador portátil y GPS

Dado lo remoto de la zona de intervención y la topografía accidentada se ha considerado estos vehículos que serán destinados a la ejecución del proyecto. Todos los equipos serán adquiridos según las normas de la FAO.

Adquisición y distribución del material

Las adquisiciones se realizarán de acuerdo a las normas de la FAO y considerando los estándares técnicos de calidad. Los insumos deben ser distribuidos, de preferencia, por los servicios locales de extensión y ONGs para reducir costos de distribución y riesgos de pérdida.

Al final del período de implementación, todos los suministros, vehículos y equipo adquirido con los fondos del Proyecto, serán transferidos a los beneficiarios del Proyecto o a las contrapartes del Gobierno. Un mes antes del final del período del Proyecto, la FAO enviará a ECHO un inventario de los bienes remanente, con una propuesta respecto al empleo de estos bienes y equipos.

7 PERSPECTIVAS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL EN TÉRMINOS DE VÍNCULOS ENTRE EMERGENCIA, REHABILITACIÓN Y DESARROLLO

7.1 Esta (o otra similar) Acción se ejecuta desde

La Representación en Perú de la FAO ha estado implementando proyectos similares en el Perú, como se ha indicado anteriormente. Con motivo de la ocurrencia de los últimos desastres, se ha puesto en funcionamiento la Unidad de Coordinación de Emergencias, con sede en la ciudad de Lima. Esta unidad depende del TCEO.

7.2 Describir el nivel esperado de sostenibilidad

Las actividades de rehabilitación propuestas en este proyecto, así como la estrategia para su implementación se han diseñado para facilitar una rápida recuperación de los medios de vida de los campesinos afectados por el terremoto. Por ello es que se busca el empoderamiento de las capacidades locales más que la sola provisión de suministros materiales.

Las organizaciones locales, al participar activamente en las acciones de rehabilitación, incorporarán de mejor manera un enfoque de prevención de desastres, quedando también con mejor posibilidad de atender futuras situaciones de emergencia.

7.3 Estrategia de continuidad (Continuum strategy).

Como ya se indicó anteriormente, la FAO priorizará el desarrollo de la capacidad local. De este modo la población será protagonista de su propio empoderamiento. Este enfoque de FAO destaca nítidamente de otras intervenciones puesto que aún con lo corto del tiempo de ejecución busca sentar las bases para la sostenibilidad de la recuperación.

Se ha considerado en la estrategia, que las autoridades locales y sus instituciones se hagan cargo del correspondiente seguimiento en el corto y mediano plazo luego de la conclusión de la intervención.

8 TEMAS TRANSVERSALES

Los componentes considerados en la propuesta, han tomado en cuenta la opinión y sugerencias de distintos actores involucrados, por lo que los recursos serán orientados a mejorar su participación en las diferentes etapas de la implementación. Se ha previsto también brindar especial atención al rol de la mujer y a la intervención de la familia entera, puesto que todos, en mayor o menor grado han sufrido los efectos del terremoto.

9 PLAN DE VISIBILIDAD Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

La estrategia de comunicación y visibilidad contribuirá al desarrollo de los objetivos específicos de la asistencia general en la emergencia, ante las comunidades beneficiarias de Chíncha e Ica, opinión pública nacional, Gobierno central, medios locales y nacionales de comunicación.

El Proyecto dará gran importancia a la visibilidad para la difusión de las actividades y los logros, involucrando a todos los actores de la rehabilitación global. Para esto el Proyecto:

- Establecerá una comunicación permanente de actividades a través de su UCE.
- Se encargará a personal especialmente dedicado a coordinar los contenidos y medios de las comunicaciones a diferentes públicos y con el empleo de diferentes medios. Esto proveerá un marco adecuado para el reconocimiento de la labor de ECHO y FAO y de su filosofía de colaboración en situaciones de desastre.
- A nivel de campo, en diferentes medios, y en los elementos distribuidos, se pondrán juntos los logos de ECHO y de la FAO. Estos distintivos también deben aparecer en los materiales impresos como folletos, boletines, y otros. Se tratará de colocar en lugares de clara visibilidad, afiches y letreros que brinden información resumida de las acciones realizadas como parte de la ejecución del Proyecto.

Actividades-Productos:

- **12 Noticias** para Web y boletines electrónicos institucionales.
- **3 Reportajes** en revistas especializadas del sector agrícola y pesca.
- **8 programas de radio educativos a través de 8 emisoras radiales** en los municipios de intervención.
- **Capacitación para los periodistas locales radiales.**
- **video testimonial de resultados** (castellano e inglés), para ser presentado a los donantes.
- **Registro fotográfico profesional** para los informes de ECHO y FAO, muestras fotográficas, afiches, piezas de divulgación y archivo de la FAO-HQ.
- **Material divulgativo y promocional**

10. COORDINACIÓN SOBRE EL TERRENO, Y CONTRAPARTES LOCALES ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

10.1 Autoridades nacionales y locales

Los Gobiernos Regionales de Ica y de Lima, deberán brindar también las facilidades de instalación y ubicación del personal asignado al Proyecto, para el buen cumplimiento de sus funciones. Desde ya se da por descontada su amplia colaboración que permita crear un marco de actividad conjunta efectivo y eficiente.

10.2 Foro de coordinación sobre el terreno

Las coordinaciones en campo son claves y serán parte importante del trabajo del personal de la FAO asignado al Proyecto. Esto incluye la interacción con otras instituciones de la zona y con aquellas de ayuda humanitaria que concurran en el ámbito de acción.

10.3 Contrapartes encargadas de la implementación

10.3.1 Nombre y dirección de la (s) autoridad (es) encargadas de la implementación.

Gobierno Regional de Lima, Dirección Regional Agraria de Lima, Agencia Agraria de Cañete y Oficina Agraria Yauyos.

Panamericana Sur, Km 145. San Vicente, Cañete.

aa_canete@minag.gob.pe

Gobierno Regional de Ica, Dirección Regional Agraria de Ica, Agencia Agraria de Pisco.

Av. Fermín Tanguis 999, Pisco.

aa_pisco@minag.gob.pe

10.3.2 Papel de la (s) autoridad (es) encargada (s) de la implementación

La FAO sostendrá a las agencias Agrarias de cada DRA en las acciones de coordinación, convocatoria, integración de esfuerzos, ambientes físicos para las tareas de almacenamiento, apoyo logístico, y coordinaciones con otras instituciones locales.

Se establecerán comités locales al nivel de distritos conformados por los municipios locales, comunidades y organizaciones de productores y Pronamachs.

10.3.3 Tipo de relaciones con la(s) autoridad(es) de implementación

La intervención de la FAO y de los Gobiernos Regionales, en el marco del Proyecto deberá considerar la firma previa de Convenios pertinentes.

10.3.4 Colaboración precedente con la (s) autoridad (es) de implementación

A lo largo de su experiencia en Perú, la FAO ha implementado diversos proyectos con los Gobiernos Regionales como contraparte nacional, habiendo sido oportunidad para crear sinergias y mecanismos de acción conjunta que ha permitido potenciar los beneficios de las acciones de los diversos proyectos; esto ha incluido tareas de seguimiento al terminar el período de ejecución, buscando ampliar las posibilidades de sostenibilidad de los efectos positivos de las intervenciones.

10.3.5 Nombre y título de la (s) persona (s) autorizada (s) a representar la (s) autoridad (es) de implementación

No aplica

10.4 Contratista (s) y procedimiento de atribución de mercados

10.4.1 Nombre y dirección del/de los contratista (s)

Los nombres serán proporcionados luego de las correspondientes etapas de convocatoria en procesos de cotización y adquisición que tendrán como marco de ejecución la transparencia de las diferentes etapas consideradas.

10.4.2 Papel del/de los contratista (s) en la implementación de esta Acción

10.4.3 Describir el procedimiento de selección del/de los contratista (s).

Los procedimientos estándar de la FAO tienen las previsiones correspondientes para realizar procesos objetivos, transparentes y eficientes de adquisiciones.

11 INFORMACIÓN FINANCIERA

- 11.1 Presupuesto total de la Acción: 275 000 EUR
- 11.2 Contribución pedida a la Comunidad europea 275 000 EUR
- Porcentaje del monto total: 100 %
- 11.3 Co-financiamento: N/A
- 11.3.1. Indicar su propia contribución: N/A
- 11.4.1. Contribuciones de otros donantes: N/A
- Name: N/A
- 11.4 Pre-financiamento pedido a la Comunidad europea N/A
- Porcentaje de la contribución total de la CE: N/A
- 11.5 Elegibilidad de gastos, fecha 26 de Septiembre 2007
- (4.3.) Fecha de comienzo de la Acción 15 de Septiembre 2007
- 11.5.1. Si la Acción ya empezó explicar los motivos que justifican esta situación:
- Acción de primera urgencia ☐
 - Operación de emergencia ☒
 - Otros ☐
- 11.5.2. Si la fecha de elegibilidad de gastos es anterior a la fecha de comienzo de la Acción justificar esta petición.

12 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

12.1 Nombre oficial de la Organización internacional, dirección, teléfono, fax, e-mail

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO
Emergency Operations and Rehabilitation Division (TCOE)
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 ROME, ITALY
Tel: (+39) 06 57054936; Fax : (+39) 06 57054941

12.2 Numero del CMA, (si aplicable)

12.3 Nombre y título del representante legal

Señora Anne M. Bauer
Directora
División de Operaciones de Emergencia y Rehabilitación (TCE)

12.4 Nombre, teléfono, fax y e-mail del responsable geográfico en la sede

Señora Hilde Niggemann
Funcionaria principal encargada de operaciones
Tel: (+39) 06 57053286; Fax: (+39) 06 57054941
Email: Hilde.Niggemann@fao.org

12.5 Nombre, teléfono, fax y e-mail del representante de la Organización internacional sobre el terreno

Señor Luis Castello
Representante de la FAO en Perú
Lima., Perú
e-mail: luis.castello@fao.org
Tel: + 51 1 4472641 / 4476690

12.6. Cuenta bancaria

- Nombre del banco: HSBC Bank plc
- Dirección de la agencia 8 Canada Square; London; UKFAO Branch.
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia
- Denominación del titular de la cuenta:
Food and Agriculture Organization of the UN
- Numero de cuenta completo (incluidos los codigos bancarios): 67115083
- Código IBAN (o código BIC del país si el IBAN no se aplica):
IBAN : GB04MIDL40051567115083; SWIFT/BIC: MIDLGB22

ANEXOS

1. Mapa de la zona de intervención (en color verde esmeralda)

ICA - Pisco

1. Huancano

LIMA - Yauyos

2. Chocos


3. Huangáscar

4. Maden

5. Viñac

6. Tupe

7. **Laraos**

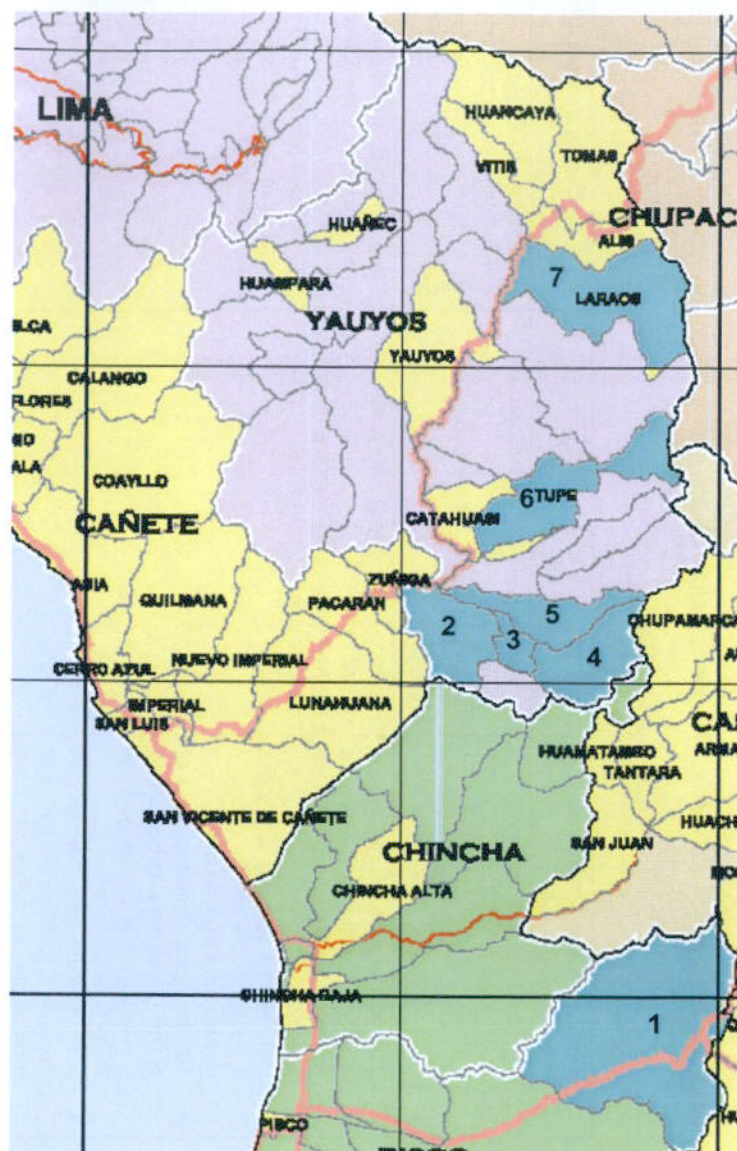

2. Cuadro lógico. Apoyo a la reconstitución de los medios de vida en las partes altas de Yauyos y Pisco, afectadas por el terremoto en Perú.

	<i>Lógica de intervención</i>	<i>Indicadores objetivamente verificables</i>	<i>Medios de verificación</i>	<i>Riesgos y supuestos</i>
Objetivo General	Rehabilitación de los medios de vida de las familias de Yauyos y Huancano, afectadas por el terremoto y su reincorporación a la actividad productiva.	2 500 personas han recuperado sus medios de subsistencia	Reportes oficiales de siembras, cosechas y producción. Reportes de campo, videos, fotografías, registros.	Beneficiarios colaboran en las labores de rehabilitación, participando de las acciones con familias y comunidades, relevando carácter comunitario y solidario de la acción frente al desastre.
Objetivos específicos	Rehabilitación de los medios de vida de la población campesina afectada por el terremoto. Reposición de infraestructura productiva (silos y herramientas) y servicios (cocinas mejoradas).	• 250 hectáreas instaladas con la semilla distribuida para la rehabilitación de su producción agrícola. • 500 módulos de cuyes entregados a las familias afectadas y reporte de resultados reproductivos. • 500 silos para almacenamiento de granos y semillas entregados y siendo utilizados por las personas de las familias receptoras. • 500 módulos de herramientas entregados, y reporte de avance de recuperación de canales de tierra para riego de parcelas.	Reportes de distribución y de instalación de cultivos. Reportes de entrega de labores, medios gráficos, visivos y entrevistas.	Clima y condiciones laborales en las zonas objetivo se presentan con normalidad. Ningún nuevo terremoto a la fecha. Participación activa de beneficiarios a los labores de rehabilitación.
Resultados	1) 31 500 kg de semillas (cereales/leguminosas/hortalizas) distribuidas. 2) 500 módulos de cuyes entregados e instalados por las familias beneficiarias. 3) 500 módulos de herramientas entregados. 4) 500 cocinas mejoradas y 500 silos metálicos han sido recibidos por las familias beneficiarias.	Registro de recepción de módulo de semillas de los 500 beneficiarios jefes de familia. Registro de recepción de módulo de cuyes de los 500 beneficiarios jefes de familia. Registro de recepción de módulo de herramientas de los 500 beneficiarios jefes de familia. Registro de recepción de cocinas mejoradas y silos metálicos de los 500 beneficiarios jefes de familia.	Reportes de entrega y recepción. Reportes técnicos de siembra. Reportes técnicos de canales de tierra rehabilitados y listos para operar. Fotografías. Videos.	Las familias beneficiarias reciben y emplean los insumos entregados aplicando los conocimientos y orientaciones impartidas al momento de su entrega con la participación de toda la familia.

Actividades	Actividades para el Resultado 1 Identificación de las familias beneficiarias, precisando su ubicación por centro poblado, y distrito, con intervención de autoridades locales. Programación de atenciones y visitas para hacer el plan de distribución. Elaborar las especificaciones técnicas y el plan de adquisiciones y traslado. Entrega de insumos y seguimiento de las siembras en campo. Actividades para el Resultado 2 Identificación de familias beneficiarias con tradición de crianza familiar. Identificación de proveedores y organización de adquisición, traslado y entrega de módulos de cuyes. Actividades para el Resultado 3 Identificación de los beneficiarios, inventario de sus pequeños canales de riego que serán incluidos en la rehabilitación. Detalle de las especificaciones técnicas de las herramientas a entregar. Organización del procedimiento de cotizaciones, logística y entrega.	FAO FAO-Perú: Unidad de Coordinación de Emergencias en Perú 2 consultores nacionales Nivel del distrito: Comités locales conformados por los municipios locales, comunidades y organizaciones de productores y Pronamachs.		

	Rehabilitación de canales. Actividades para el Resultado 4 Identificación de familias beneficiarias, evaluación de necesidades estructurales en sus viviendas para la instalación de las cocinas mejoradas y los silos metálicos. Determinación de las especificaciones técnicas para la construcción de las cocinas mejoradas y de los silos. Cotizaciones, construcción, traslado, entrega y supervisión de la instalación en las viviendas.			
--	---	--	--	--



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR HUMANITARIAN AID - ECHO

Contribution agreement - International Organisations
ANNEX II

Name of the International Organisation:

Title of the Action:

Contribution agreement number:

Initial budget ☐ Modified Budget ☐ Date:

BUDGET SUMMARY AND FINANCIAL PLAN			
A. ELIGIBLE EXPENDITURE		B. FINANCIAL PLAN	
01. Goods & services delivered to beneficiaries	191,500	* Total eligible costs:	€ 275,000
01.01. Food Security	102,500		
01.02. Water and Sanitation	-		
01.03. Health	-	* Maximum EC contribution :	
01.04. Nutrition	-	Percentage of total eligible costs	100%
01.05. Shelter	-	Corresponding amount	€ 275,000
01.06. Non food items	32,000		
01.07. Rehabilitation/continuum	-	* Contribution Int Organisation :	€ 0
01.08. Disaster preparedness and mitigation	-		
01.09. Special mandates	27,000	* Contributions by other donors :	€ 0
01.10. Specific actions	-	Percentage of total eligible costs	0%
01.11. De-mining and awareness	-		
01.12. International transport	-		
01.13. Personnel	30,000	* Pre-financing payment :	€ 220,000
02. Support costs	65,509	Percentage of EC contribution	80%
02.01. Personnel	6,400		
02.02. Local logistic costs	13,709		
02.03. Durable equipment	25,900		
02.04. Security	1,500		
02.05. Feasibility, needs assesment and other studies	-		
02.06. Specialised services	8,000		
02.07. Insurance costs	-		
02.08. Visibility and communication programmes	10,000		
02.09. Others: as specified in the proposal	-		
Subtotal: direct costs	257,009		
03. Indirect costs	17,991		
04. Reserve (pro memoria)	-		
Total Eligible Costs :	275,000		
